

EEQ - Empresa Eléctrica Quito
Gerencia de Distribución
Dirección Diseño y Ejecución

PROYECTO: I032 EEQ-INV-PMD-Calidad 2015_Reguladores

Líder del Proyecto:	Gallardo Castellanos, Rodrigo Patricio (rgallardo@eeq.com.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Recalde Varela, Edwin Charles	Programas Relacionados:	
Titular:	Curillo Paguay, Angel Augusto	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	206,700.00
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/07/2015 - 31/03/2016
Fecha de última actualización:	04/02/2016	Fecha de Fin Base:	31/03/2016
Modificado por:	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	Fecha del siguiente Hito:	31/03/2016

DATOS GENERALES

Descripción

PROPÓSITO: Reforzar las actuales redes que no abastacen la demanda.
 Regularizar el suministro del servicio que actualmente se entrega a través de redes abiertas.

PRODUCTO: Redes eléctricas de calidad.

Beneficios Cualitativos

Mejorar la calidad del servicio.
 Mejorar la continuidad del servicio.
 Mejorar la confiabilidad del servicio.
 Contribuir a la reducción de pérdidas de energía eléctrica.

Tipo de Beneficiario

Externo: Usuarios de la red, sociedad en general

Restricciones

TIEMPO: 8 meses


COSTO: USD 312.000,00

ALCANCE: Cumplimiento de especificaciones técnicas y normas indicadas en los pliegos.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 81.82 %
 Fecha de Inicio: 01/07/2015 Fecha de Fin: 31/03/2016

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2016	Avance programado acumulado											
	40 %	40 %	100 %									
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ENERO 2016: El contrato tiene un plazo de entrega 180 días.	Gallardo Castellanos, Rodrigo Patricio	05/01/2016 - 01:04 PM
DICIEMBRE 2015: El contrato tiene un plazo de entrega 180 días.	Gallardo Castellanos, Rodrigo Patricio	04/01/2016 - 12:13 PM
NOVIEMBRE 2015: El contrato tiene un plazo de entrega 180 días.	Gallardo Castellanos, Rodrigo Patricio	04/01/2016 - 12:12 PM
OCTUBRE - DICIEMBRE 2015 El contrato tiene un plazo de entrega 180 días.	Gallardo Castellanos, Rodrigo Patricio	21/12/2015 - 09:15 AM
SEPTIEMBRE 2015 Se procede a legalizar el contrato de los reguladores DCP-186-2015, y se paga el anticipo al proveedor previo a la entrega de las pólizas correspondientes.	Gallardo Castellanos, Rodrigo Patricio	21/12/2015 - 09:14 AM
AGOSTO 2015 Se elabora la resolución de adjudicación correspondiente.	Gallardo Castellanos, Rodrigo Patricio	21/12/2015 - 09:13 AM
JULIO 2015 Se procede a elaborar los pliegos para la adquisición de los reguladores y se autoriza su publicación en el portal del SERCOP.	Gallardo Castellanos, Rodrigo Patricio	21/12/2015 - 09:13 AM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Alcance. Incumplimiento del proveedor CAUSARÍA retraso en la ejecución de los proyectos	13/12/2015	Rodrigo Patricio Gallardo Castellanos	20 %	40	8	0/0

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN_Pliegos elaborados y publicados en el SERCOP	2-Publicación de Pliegos	31/07/2015		02/07/2015		Sí	10.0
2	PLANEACIÓN_Proceso adjudicado	3-Adjudicación	31/08/2015		05/08/2015		Sí	10.0
3	PLANEACIÓN_Contrato suscrito	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		01/09/2015		Sí	10.0
4	EJECUCIÓN_Anticipo pagado a proveedor	4-Inicio de Trabajo	31/10/2015		15/09/2015		Sí	10.0
5	CIERRE_Equipos entregados	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2016	31/03/2016			No	60.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	206,700.00 **
Costo Total:	312,000.00
Total Devengado:	97,500.00
% Costo Total Devengado:	31.25 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 31.25 %

Perfil Económico 2016

	Años Previos	Año Actual (2016)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	97,500.00	109,200.00	0.00	206,700.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	97,500.00	109,200.00	0.00	206,700.00
Ppto. Codificado	97,500.00	109,200.00	0.00	206,700.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2016)		0.00		
Programado a Devengar	97,500.00	109,200.00	0.00	206,700.00
Ppto. Devengado	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00
Estimado a fin de año	* 97,500.00	109,200.00	0.00	206,700.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 100.00 %	0.00 %	0.00 %	47.17 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016

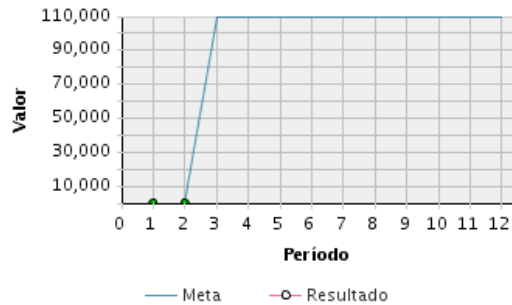

Presupuesto Mensual 2016

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2016							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	109,200.00		109,200.00				
Abr							
May							
Jun							
Jul							
Ago							
Sep							
Oct							
Nov							
Dic							
Total	109,200.00	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
4	Incrementar la capacidad instalada en redes de medio, bajo voltaje y alumbrado público MEDIANTE la ejecución de los planes anuales de expansión, la construcción, mejora y remodelación de redes de distribución y alumbrado público.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Hito 1_Publicación de pliegos en el SERCOP	Convocatoria.pdf	05/01/2016
2	Hito 2_ Adjudicación de los reguladores	Resolucion_de_Adjudicacion.pdf	05/01/2016
3	Hito 3_Contratación de reguladores	Contrato_reguladores.pdf	05/01/2016
4	Hito 4_Pago del anticipo contrato DCP 186-2015	Comprobante_pago_de_anticipo.pdf	05/01/2016

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Gallardo Castellanos, Rodrigo Patricio	Ingeniero Eléctrico	Ingeniero Eléctrico EEQ	rgallardo@eeq.com.ec	
Jácome Morejón, Merci Yolanda	Jefe Departamento de Proyectos	Jefe de Sección - EEQ	mejacome@eeq.com.ec	
Ramos Tubón, Luis Edmundo	Jefe de Sección Varios Moradores	Jefe de Sección Varios Moradores	eramos@eeq.com.ec	
