

EEQ - Empresa Eléctrica Quito

Gerencia de Distribución

Dirección Operatividad del Sistema

PROYECTO: I025 EEQ-INV-Remodelación de Redes DDZN- Salidas de Primarios Subterráneos Subestación C, E Río Coca PC-14-045

Líder del Proyecto:	Zea Pinto, Miguel Antonio (mzea@eeq.com.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Ríos Paredes, Martín	Programas Relacionados:	
Titular:	Salazar Díaz, Carlos Iván	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	224,468.91
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	04/07/2017 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	04/09/2018	Fecha de Fin Base:	15/06/2018
Modificado por:	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	Fecha del siguiente Hito:	31/12/2018

DATOS GENERALES

Descripción

PROPÓSITO: Cambiar el cable subterráneo de la salidas de los primarios de la subestación 16 Río Coca con la finalidad aumentar la calidad y confiabilidad en los sectores El Inca, El Batán. Ya que los mismos debido al tiempo de uso pueden ocurrir fallas en operación.

PRODUCTO: Mejorar la calidad de servicio de los primarios de la subestación 16 Río Coca.

OBJETIVO GENERAL: Dar confiabilidad eléctrica a los usuarios, cambiando redes soterradas que por estar en operación sufren deterioro

OBJETIVO ESPECÍFICO: Dar mayor seguridad a los técnicos al ejecutar trabajos con este tipo de cables.

Beneficios Cualitativos

Incrementar la capacidad del conductor en la salida de los primarios de la subestación 16, para disminuir las pérdidas técnicas y aumentar la confiabilidad del sistema de distribución, de los primarios.

Tipo de Beneficiario

Todos los clientes de los sectores El Inca, El Batán.

Restricciones

CALIDAD: La ejecución de los trabajos se realizara de acuerdo a lo establecido en las Normas de Sistemas de Distribución Vigentes por el MEER y la Empresa Eléctrica Quito.

TIEMPO: El 01/08/2017 y finalizará el 31/12/2018


PRESUPUESTO: El presupuesto asignado por la ARCONEL para los proyectos de la Calidad Regulación 004/01 es de USD \$ 236.654,00 (Doscientos treinta y seis mil seiscientos cincuenta y cuatro 00/100 Dólares) incluido IVA.

CONTRATO: La ejecución de los proyectos se lo realizarán, mediante la contratación de bienes y servicios.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 78.39 %
 Fecha de Inicio: 04/07/2017 Fecha de Fin: 31/12/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

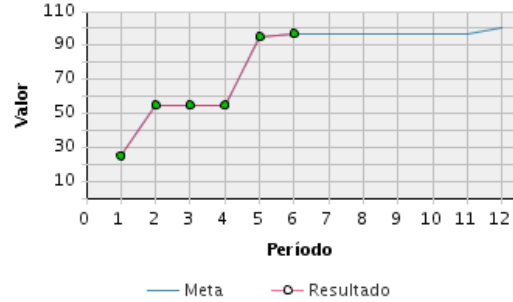

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	25 %	55 %	55 %	55 %	95 %	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %	100 %
	Avance real acumulado											
	25 %	55 %	55 %	55 %	95 %	97 %						
Estado												
	●	●	●	●	●	●						

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
AGOSTO 2018: 1. Se realiza gestiones para entrega recepción provisional (HITO 13)	Zea Pinto, Miguel Antonio	03/09/2018 - 07:22 PM
JULIO 2018: 1. Se realiza gestiones para entrega recepción provisional (HITO 13)	Zea Pinto, Miguel Antonio	03/09/2018 - 07:21 PM
JUNIO 2018: 1. Se realiza gestiones para entrega recepción provisional (HITO 13)	Zea Pinto, Miguel Antonio	25/07/2018 - 10:03 PM
MAYO 2018: 1. Se ejecuta obras eléctricas (HITO 11) 2. Se fiscaliza obras eléctricas (HITO 12)	Zea Pinto, Miguel Antonio	02/07/2018 - 01:21 PM
ABRIL 2018: 1. Se entrega anticipo al Contratista (HITO 7) 2. Se realiza compra de materiales (HITO 8) 3. Se continúa obras civiles (HITO 9) 4. Se fiscaliza obras civiles (HITO 10)	Zea Pinto, Miguel Antonio	01/06/2018 - 08:14 PM
MARZO 2018: 1. Se continua trabajos por el Contratista (HITO 9)	Zea Pinto, Miguel Antonio	03/05/2018 - 06:02 PM
FEBRERO 2018: 1. Se inicia señalización en sitio por el Contratista (HITO 9)	Zea Pinto, Miguel Antonio	03/04/2018 - 07:59 AM
ENERO 2018: 1. Se entrega anticipo al Contratista (HITO 7) 2. Se inicia compra de materiales por el Contratista (HITO 8)	Zea Pinto, Miguel Antonio	02/03/2018 - 04:32 PM
DICIEMBRE 2017: 1. Reunión con Contratación Pública para revisión de TDR. (Hito cumplido 1) 2. Se facilitó nuevos Estudiantes de Ingeniería para colaboración con análisis (Hito cumplido 3) 3. Se mantiene nuevas reuniones y se hace el proceso con APU's (Hito cumplido 3) 4. Se publica nuevamente proceso	Zea Pinto, Miguel Antonio	02/03/2018 - 04:31 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
5. Se continúa en proceso		
NOVIEMBRE 2017: 1. Reunión con Contratación Pública para revisión de TDR. (Hito cumplido 1) 2. Se facilitó nuevos Estudiantes de Ingeniería para colaboración con análisis (Hito cumplido 3) 3. Se mantiene nuevas reuniones y se hace el proceso con APU's (Hito cumplido 3) 4. Se publica nuevamente proceso	Zea Pinto, Miguel Antonio	05/01/2018 - 01:52 PM
OCTUBRE 2017: 1. Reunión con Contratación Pública para revisión de TDR. (Hito cumplido 2) 2. Se facilitó nuevos Estudiantes de Ingeniería para colaboración con análisis (Hito cumplido 3) 3. Se mantiene nuevas reuniones y se hace el proceso con APU's (Hito cumplido 4) 4. Debido a que no clasifican Oferentes se declara Desierto y se reinicia nuevamente	Zea Pinto, Miguel Antonio	01/12/2017 - 07:15 AM
SEPTIEMBRE 2017: 1. Reunión con Contratación Pública para revisión de TDR. (Hito cumplido 2) 2. Se facilitó nuevos Estudiantes de Ingeniería para colaboración con análisis (Hito cumplido 3) 3. Se mantiene nuevas reuniones y se hace el proceso con APU's (Hito cumplido 4)	Zea Pinto, Miguel Antonio	03/11/2017 - 07:30 AM
AGOSTO 2017: 1. Se creó la ficha técnica. 2. Se elaboró los términos de referencia.	Zea Pinto, Miguel Antonio	03/10/2017 - 08:59 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. * General. La falta de materiales CAUSARÍA retraso en la ejecución de obra	19/01/2018	Miguel Antonio Zea Pinto	20 %	80	16	1/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha

HITOS

Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1 PLANEACIÓN: Análisis de contrato para la ejecución de obras en la salida de los primarios de subestación No. 16 Río Coca.	1-Solicitud de Información	05/09/2017		05/09/2017		Sí	5.0
2 PLANEACIÓN: Publicación de contrato para la ejecución de obras en la salida de los primarios de subestación No. 16 Río Coca.	2-Publicación de Pliegos	22/09/2017		22/09/2017		Sí	5.0
3 PLANEACIÓN: Proceso de contrato para la ejecución de obras en la salida de los primarios de subestación No. 16 Río Coca.	5-Entregables Intermedios	22/11/2017		22/11/2017		Sí	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
4	PLANEACIÓN: Proceso de contrato para la ejecución de obras en la salida de los primarios de subestación No. 16 Río Coca.	5-Entregables Intermedios	01/12/2017		01/12/2017		Sí	5.0
5	PLANEACIÓN: Adjudicación de contrato para la ejecución de obras en la salida de los primarios de subestación No. 16 Río Coca.	3-Adjudicación	24/01/2018		24/01/2018		Sí	5.0
6	PLANEACIÓN: Firma de contrato para ejecución de obras	5-Entregables Intermedios	05/02/2018		05/02/2018		Sí	10.0
7	PLANEACIÓN: Entrega de anticipo al contratista adjudicado	5-Entregables Intermedios	12/02/2018		12/02/2018		Sí	10.0
8	PLANEACIÓN: Adquisición materiales para la ejecución de obras	4-Inicio de Trabajo	19/02/2018		19/02/2018		Sí	10.0
9	EJECUCIÓN: Construcción de obras civiles	5-Entregables Intermedios	15/05/2018		15/05/2018		Sí	10.0
10	EJECUCIÓN: Fiscalización de obras civiles	5-Entregables Intermedios	17/05/2018		17/05/2018		Sí	10.0
11	EJECUCIÓN: Construcción de redes eléctricas	5-Entregables Intermedios	24/05/2018		24/05/2018		Sí	10.0
12	EJECUCIÓN: Fiscalización de redes eléctricas	5-Entregables Intermedios	28/05/2018		28/05/2018		Sí	10.0
13	CIERRE: Entrega y recepción definitiva de las nuevas salidas de los primarios de la subestación No. 16 Río Coca.	5-Entregables Intermedios	15/06/2018		15/06/2018		Sí	2.0
14	CIERRE: Entrega y recepción de las nuevas salidas de los primarios de la subestación No. 16 Río Coca.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2018	31/12/2018			No	3.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	224,468.91 **
Costo Total:	224,468.90
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	224,468.91	0.00	224,468.91
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	224,468.91	0.00	224,468.91
Ppto. Codificado	0.00	224,468.91	0.00	224,468.91
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2018)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	224,468.91	0.00	224,468.91
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	224,468.91	0.00	224,468.91
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018

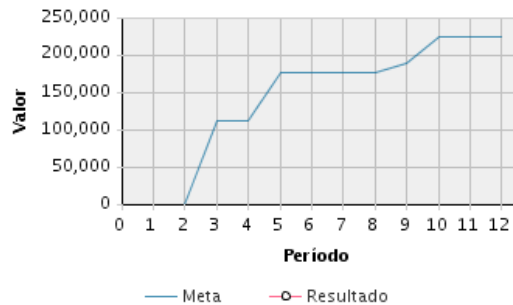

Presupuesto Mensual 2018

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	112,236.23		112,236.23				
Abr	0.00		112,236.23				
May	64,336.78		176,573.01				
Jun	0.00		176,573.01				
Jul	0.00		176,573.01				
Ago	0.00		176,573.01				
Sep	12,756.50		189,329.51				
Oct	35,139.40		224,468.91				
Nov	0.00		224,468.91				
Dic	0.00		224,468.91				
Total	224,468.91						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
3	Incrementar la calidad de producto y servicio técnico en medio y bajo voltaje MEDIANTE la automatización de alimentadores primarios de distribución, coordinación de protecciones, acciones de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y mejoramiento de redes existentes.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACIÓN HITO 1.- SEPTIEMBRE 2017: Acta de Constitución Proyecto I025 EEEQ-INV-Remodelación de Redes DDZN- Salidas de Primarios Subterráneos Subestación C, E Río Coca PC-14-045	A.1._ACTA_DE_CONTITUCIÓN_RIO_COCA_(P_C_E).pdf	22/11/2017
2	ASOCIACIÓN HITO 12,13.- Delegado técnico	B.3._Requerimiento_delegado_tecnico_EEQ-GD-2018-0905-ME_del_16_de_julio_2018.pdf	03/09/2018
3	ASOCIACIÓN HITO 2,3,4,5,6.- Proceso de contrato para la ejecución de obras en la salida de los primarios de subestación No. 16 Río Coca.	A.2_Resolución_de_Gerencia.pdf	26/01/2018
4	ASOCIACIÓN HITO 7,8,9,10,11,12.- Pago anticipo	A.6._Factura_anticipo_del_14_de_marzo_2018.pdf	03/09/2018

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Chasipanta González, Joaquín	Administrador de Contrato	Jefe Sección Operación y Mantenimiento Rural zona Noroeste	jchasipanta@eeq.com.ec	
Salazar Díaz, Carlos Iván	Director de Distribución Zona Norte	Director Distribución Zona Norte	isalazar@eeq.com.ec	
Sisa Sisa, Víctor Arnulfo	Fiscalizador del Contrato	SUPERVISOR OPERADORES ZONA NORTE - EEQ	vsisa@eeq.com.ec	

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
121503_1.jpg	01/09/2017
