

EEQ - Empresa Eléctrica Quito
Gerencia de Distribución
Dirección Diseño y Ejecución

PROYECTO: I018 EEQ-INV-PMD-Proyectos Ecuador Estratégico en Sucumbíos y Orellana

Líder del Proyecto:	Calderon Olivo, Juan Gabriel (jgcalderon@eeq.com.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Recalde Varela, Edwin Charles	Programas Relacionados:	
Titular:	Curillo Paguay, Angel Augusto	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	5,146,221.65
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2014 - 29/02/2016
Fecha de última actualización:	19/09/2016	Fecha de Fin Base:	29/12/2014
Modificado por:	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	Fecha del siguiente Hito:	

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se ejecutarán proyectos eléctricos de distribución financiados con fondos del Plan Ecuador Estratégico en las provincias de Sucumbíos y Orellana

POBLACIÓN OBJETIVO: El proyecto contempla dotar de servicio de energía eléctrica a la población residencial de los sectores rurales de las Provincias de Orellana y Sucumbíos.

PRODUCTO/SERVICIO: Se construirá redes de distribución en medio voltaje, bajo voltaje, alumbrado público, y se instalará transformadores, luminarias, acometidas y medidores, de tal forma que se garantice un servicio de calidad para los sectores que forman parte el presente proyecto.

LINEA BASE: Se indica la cobertura del suministro de energía eléctrica del Perfil de Cobertura 2013 realizado por el CONELEC, la electrificación a nivel nacional es del 95.77 %, que corresponden: al 91.60 % para el sector rural y 97.99 % para el sector urbano.

OBJETIVO GENERAL: Ampliar la cobertura de servicio de Energía Eléctrica en las Provincias de Orellana.y Sucumbíos

OBJETIVO ESPECIFICO: Se construirá redes de distribución en varios sectores de las Provincias de Orellana y Sucumbíos de acuerdo a las normas de distribución y los lineamientos emitidos por el Ministerio de Electricidad con relación a la infraestructura de distribución, de tal forma que se garantice un servicio de calidad.

Beneficios Cualitativos

Se beneficiará con el servicio eléctrico de calidad a la ciudadanía de las provincias de Orellana y Sucumbíos.

Tipo de Beneficiario

Ciudadanía en general

Restricciones

TIEMPO: 26 Meses.

COSTO: USD \$ 6,053,231.05.

ALCANCE: El proyecto contempla la construcción de redes de distribución en medio voltaje, bajo voltaje, alumbrado público, instalación de transformadores, luminarias, acometidas y medidores, de tal forma que se garantice un servicio de calidad para los sectores que forman parte del presente proyecto.


Los proyectos se construirán considerando las normas de distribución y los lineamientos emitidos por el Ministerio de Electricidad con relación a la infraestructura de distribución.

RECURSOS: El proyecto es financiado con recursos provenientes del Estado a través de un convenio de cooperación interinstitucional entre la Empresa Eléctrica Quito y Ecuador Estratégico EP.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	--------	-------------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
Fecha de Inicio: 01/01/2014 **Fecha de Fin:** 29/02/2016

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2016	Avance programado acumulado											
	98 %	100 %										
	Avance real acumulado											
	98 %	100 %										
	Estado											
	●	●										

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MARZO 2016:</p> <p>1. Se realiza el pago del saldo pendiente del Proyecto por un valor de USD 23.488.23, y se liquida el Proyecto en (- 6.167.62), se ejecuta el 100% del Proyecto contratado Colonia Babahoyo 2. (Hito Cumplido 25)</p>	Calderon Olivo, Juan Gabriel	01/04/2016 - 12:32 PM
<p>FEBRERO 2016:</p> <p>1. Se realiza la liquidación económica del Proyecto denominado Colonia Babahoyo 2 y se firma el Acta de Recepción Definitiva. (Hito Cumplido 25)</p> <p>2. Se envía la factura con la liquidación económica al Departamento de Presupuesto para proceder con el pago respectivo, estos documentos son devueltos por existir errores, se corrige los errores y se despacha nuevamente la documentación a fines de mes, por lo que la liquidación económica del proyecto será realizada en el mes de marzo. (Hito Cumplido 25)</p>	Curillo Paguay, Angel Augusto	03/03/2016 - 09:24 AM
<p>ENERO 2016:</p> <p>1. Se ha concluido todas las Obras de electrificación parte de los convenios con EEEP y EEQ, se encuentra pendiente la liquidación del Proyecto Colonia Babahoyo 2 (Hito cumplido 24)</p> <p>2. Se realiza Inspección del proyecto con un funcionario de CNEL, ajeno a la Fiscalización y Administración del Proyecto Colonia Babahoyo 2, para realizar la liquidación respectiva previo a la recepción definitiva del proyecto (Hito cumplido 24).</p>	Calderon Olivo, Juan Gabriel	03/03/2016 - 08:58 AM
<p>DICIEMBRE 2015</p> <p>Se ejecutan pagos correspondientes a los contratos complementarios de los convenios SG 502 2013 y SG 016-2014, para su respectiva liquidación</p>	Calderon Olivo, Juan Gabriel	03/02/2016 - 08:34 AM
<p>NOVIEMBRE 2015</p> <p>Con fecha 4 de noviembre se firma el contrato DCP-242-2015 entre el Gerente de la EEQ y el Ing. Paulino Pérez para la construcción del proyecto Colonia Babahoyo 2 por un monto de USD 59,311.69 incluido IVA y un plazo de ejecución de 60 días.</p>	Calderon Olivo, Juan Gabriel	22/12/2015 - 11:41 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se cancela el valor del anticipo del proyecto Colonia Babahoyo y se inicia la construcción del proyecto.		
<p>OCTUBRE 2015</p> <p>Se pasa la documentación del proceso MCBS-EEQSGD001-2015 a Procuraduría para la elaboración del contrato favor del ingeniero Paulino Pérez.</p> <p>Se planilla estados de pago del contrato DCP-273-2014 a favor del consorcio EOVl perteneciente al convenio 502 con EEEP</p>	Calderon Olivo, Juan Gabriel	22/12/2015 - 11:41 AM
<p>SEPTIEMBRE 2015</p> <p>Mediante memo GGS-DS-UPS-000113 del 29 de septiembre de 2015 se envía a Gerencia General el informe de calificación del proceso MCBS-EEQSGD001-2015, a favor del ingeniero Paulino Pérez para la elaboración de la Resolución de Adjudicación para la construcción del proyecto Colonia Babahoyo 2.</p> <p>se firman contratos complementarios y ordenes de cambio de los contratos DCP 273 y 277 para su respectiva liquidación</p>	Calderon Olivo, Juan Gabriel	22/12/2015 - 11:37 AM
<p>AGOSTO 2015</p> <p>Se presentan 8 manifestaciones de interés para el proceso MCBS-EEQSGD001-2015, de lo cual La oferta del proveedor PROCOBRA S.A. ha sido descalificada del procedimiento en el nivel Nacional; por lo tanto se continuará con e siguiente proveedor de la lista.</p> <p>Aún no realiza la transferencia por parte de EEEP de los fondos restantes de los convenios SG-093-502 y 016</p>	Calderon Olivo, Juan Gabriel	22/12/2015 - 11:34 AM
<p>JULIO 2015</p> <p>Se publica el pliego para contratar la construcción del proyecto Colonia Babahoyo 2 el 28 de julio de 2015, mediante proceso de MENOR CUANTÍA DE BIENES Y/O SERVICIOS con código MCBS-EEQSGD001-2015.</p> <p>De acuerdo al cronograma establecido en el pliego se tiene previsto finalizar el proceso el 20 de agosto de 2015.</p> <p>Referente a los proyectos ejecutados en el 2014, se procederá con las liquidaciones una vez que EEEP transfiera los recursos a las cuentas de la EEQ.</p>	Calderon Olivo, Juan Gabriel	22/12/2015 - 11:33 AM
<p>JUNIO 2015</p> <p>Se emite la Resolución de reforma al PAC el 24 de junio de 2015 con lo cual se realiza la Solicitud de Servicio 1030 para iniciar el proceso de contratación.</p> <p>Aún no realiza la transferencia de fondos restantes de los convenios SG-093-502 y 016, por lo que únicamente se cubre con la partida los costos administrativos.</p> <p>Se publicará los pliegos una vez autorizada la Solicitud de Servicio 1030 por los diferentes departamentos de la EEQ.</p> <p>Referente a los proyectos ejecutados en el 2014, se procederá con las liquidaciones una vez que EEEP transfiera los recursos a las cuentas de la EEQ.</p>	Calderon Olivo, Juan Gabriel	22/12/2015 - 11:31 AM
<p>MAYO 2015</p> <p>Ecuador Estratégico realiza la transferencia de fondos el 23 de abril de 2015 por un monto de USD 66707.39 con lo cual se inicia el proceso de reforma al PAC 2015 para contratar la construcción del proyecto Colonia Babahoyo 2.</p> <p>Aún no realiza la transferencia de fondos restantes de los convenios SG-093-502 y 016, por lo que únicamente se cubre con la partida los costos administrativos.</p> <p>Se iniciará el proceso de contratación del proyecto Colonia Babahoyo 2 una vez emitida la Resolución de reforma al PAC 2015.</p>	Calderon Olivo, Juan Gabriel	22/12/2015 - 11:30 AM
<p>ABRIL 2015</p>	Calderon Olivo, Juan Gabriel	04/05/2015 - 10:09 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Mediante oficio CNEL-SUC-ADM-2015-0237-O del 23 de marzo de 2015, se solicitó a EEEP la transferencia de los recursos para liquidar los proyectos que forman parte de la presente ficha, a la fecha no se ha realizado dicha transferencia, por consiguiente no se puede liquidar de los proyectos ejecutados en el año 2014 y tampoco se puede ejecutar el proyecto Colonia Babahoyo contemplado para el presente año.</p> <p>El proyecto no se cerrará mientras Ecuador Estratégico no realice los desembolsos a la EEQ.S.A. Convenios SG-093-2013, SG-502-2013, SG-016-2014.</p>		
<p>Marzo 2015</p> <p>A pesar de estar concluida la construcción de los proyectos que se manejan en esta ficha como proyectos de arrastre, no se ha podido realizar la liquidación económica, ya que EEEP no realiza la transferencia a la EEQ del dinero restante contemplado en el convenio; por esta misma causa no se ha podido iniciar el proceso de contratación del proyecto denominado colonia Babahoyo cuya ejecución se programa para el presente año.</p>	Calderon Olivo, Juan Gabriel	30/04/2015 - 03:49 PM
<p>FEBRERO 2015</p> <p>Los proyectos se encuentran en etapa de ejecución</p>	Calderon Olivo, Juan Gabriel	01/04/2015 - 08:48 AM
<p>ENERO 2015</p> <p>Los proyectos se encuentra en fase de Ejecución.</p> <p>Los valores cargados con corte al mes de enero corresponden a saldos pendientes del año 2014</p>	Calderon Olivo, Juan Gabriel	03/02/2015 - 11:26 AM
<p>NOVIEMBRE 2014</p> <p>Se tiene adjudicado la construcción de todos los proyectos de electrificación contemplados en el convenio de financiamiento con Ecuador Estratégico, se adjunta listado de proyectos con el informe de avance y el informe económico al mes de noviembre de 2014.</p>	Calderon Olivo, Juan Gabriel	29/12/2014 - 05:06 PM
<p>OCTUBRE 2014</p> <p>A la fecha se registra un avance del 90% en los proyectos adjudicados y firmados los contratos en el mes de junio, existe un retraso en tres contratos que se adjudicaron el los meses de septiembre y octubre los cuales no registran un avance a la fecha.</p>	Calderon Olivo, Juan Gabriel	28/11/2014 - 12:15 PM
<p>SEPTIEMBRE 2014</p> <p>A la fecha se encuentra contratada la totalidad de los proyectos contemplados dentro del convenio con Ecuador Estratégico, los proyectos que se inicio su construcción entre los meses de junio y julio reportan un avance promedio del 80%</p>	Calderon Olivo, Juan Gabriel	04/11/2014 - 06:18 PM
<p>AGOSTO 2014</p> <p>El proceso COTOB-EEQSGD008-2014 fue declarado desierto para lo cual se realizo los tramites correspondientes para efectuar su reinicio con código COTOB-EEQSGD011-2014 para la contratación de la construcción de redes de distribución en la provincia de Orellana, a la fecha se encuentra en etapa de calificación de ofertas.</p>	Calderon Olivo, Juan Gabriel	03/10/2014 - 03:10 PM
<p>AGOSTO 2014</p> <p>El proceso COTOB-EEQSGD008-2014 fue declarado desierto para lo cual se realizo los tramites correspondientes para efectuar su reinicio con código COTOB-EEQSGD011-2014 para la contratación de la construcción de redes de distribución en la provincia de Orellana, a la fecha se encuentra en etapa de calificación de ofertas.</p>	Calderon Olivo, Juan Gabriel	03/10/2014 - 03:04 PM
<p>JULIO 2014</p> <p>De los tres procesos publicados en el mes de junio, el proceso COTOB-EEQSGD008-2014 para la contratación de la construcción de redes de distribución en la provincia de Orellana fue declarado desierto, por lo que se realiza el trámite pertinente para solicitar la actualización de la certificación de disponibilidad presupuestaria y la publicación de nuevos pliegos.</p> <p>Los procesos COTOB-EEQSGD009-2014 y COTOB-EEQSGD010-2014, han sido adjudicados y se encuentra en etapa de firma de contratos con los ingenieros contratistas.</p>	Calderon Olivo, Juan Gabriel	04/09/2014 - 10:01 AM
<p>JUNIO 2014</p> <p>Se firman contratos de los seis procesos y se realiza pagos de anticipos.</p>	Calderon Olivo, Juan Gabriel	04/08/2014 - 10:09 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se publica dos nuevos procesos códigos COTOB-EEQSGD008-2014 y COTOB-EEQSGD009-2014 para la contratación de materiales y mano de obra para la construcción de redes de distribución en las provincias de Orellana y Sucumbios, a la fecha estos procesos se encuentran en calificación de ofertas.		
<p>MAYO 2014.</p> <p>De acuerdo a lo publicado en los pliegos se realiza visitas a los oferentes que quedaron en primer lugar para verificar la veracidad de lo ofertado referente a equipos, herramientas y personal comprometido para la ejecución de los proyectos.</p> <p>Se adjudica en el portal los 6 procesos de contratación.</p> <p>A la fecha los oferentes que resultaron adjudicados en los 6 procesos de contratación de materiales y mano de obra para la ejecución de los proyectos se encuentran reuniendo documentos para presentar en contratación Pública para firma de los contratos.</p>	Calderon Olivo, Juan Gabriel	08/07/2014 - 08:36 AM
<p>ABRIL 2014.</p> <p>Se entrega calificación a la secretaria de los procesos para publicar en el portal de compras públicas.</p>	Calderon Olivo, Juan Gabriel	04/06/2014 - 07:40 AM
<p>MARZO 2014</p> <p>Se publican 7 procesos para la contratación de bienes y servicios para la construcción de los proyectos de electrificación en Sucumbios y Orellana, se cancela un proceso de electrificación para en sector de TIPUTINI ya que los recursos para este proyecto fueron autorizados a través del programa PMD, los restantes procesos se encuentran en etapa de convalidación de errores.</p>	Calderon Olivo, Juan Gabriel	05/05/2014 - 10:09 AM
<p>FEBRERO 2014:</p> <p>Se realizó la preparación de documentos para iniciar el proceso pre contractual del proyecto que incluye servicios de mano de obra y materiales.</p>	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	03/04/2014 - 12:36 PM
<p>ENERO 2014:</p> <p>El proyecto Iniciará en Marzo del 2014.</p>	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	05/03/2014 - 12:19 PM

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 1 - Norte > Sucumbios > Toda la Provincia de Sucumbios
2	Zona 2 - Centro Norte > Orellana > Toda la Provincia de Orellana

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: Pliegos elaborados	1-Solicitud de Información	26/02/2014		26/02/2014		Sí	2.0
2	PLANEACIÓN: Pliegos Publicados	1-Solicitud de Información	15/03/2014		14/03/2014		Sí	2.0
3	PLANEACIÓN: Proceso Adjudicado	2-Publicación de Pliegos	30/05/2014		28/05/2014		Sí	2.0
4	PLANEACIÓN: Contrato Firmado	2-Publicación de Pliegos	16/06/2014		16/06/2014		Sí	1.0
5	PLANEACIÓN: Primer Informe de Avance de Proceso emitido	3-Adjudicación	15/07/2014		15/07/2014		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
6	PLANEACIÓN: Segundo Informe de Avance de Proceso emitido	3-Adjudicación	15/08/2014		15/08/2014		Sí	1.0
7	EJECUCIÓN: Informe del 10% de avance de proyecto emitido	4-Inicio de Trabajo	15/09/2014		15/09/2014		Sí	1.0
8	EJECUCIÓN: Informe del 15% de avance de proyecto emitido	5-Entregables Intermedios	15/10/2014		15/10/2014		Sí	5.0
9	EJECUCIÓN: Informe del 20% de avance de proyecto emitido	5-Entregables Intermedios	14/11/2014		14/11/2014		Sí	5.0
10	EJECUCIÓN: Informe del 30% de avance de proyecto emitido	5-Entregables Intermedios	01/12/2014		01/12/2014		Sí	10.0
11	EJECUCIÓN: Informe del 40% de avance de proyecto emitido	5-Entregables Intermedios	29/12/2014		29/12/2014		Sí	10.0
12	EJECUCIÓN: Informe del 45% de avance de proyecto emitido	5-Entregables Intermedios	31/01/2015		31/01/2015		Sí	5.0
13	EJECUCIÓN: Informe del 50% de avance de proyecto emitido	5-Entregables Intermedios	28/02/2015		28/02/2015		Sí	5.0
14	EJECUCIÓN: Informe del 55% de avance de proyecto emitido	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	5.0
15	EJECUCIÓN: Informe del 60% de avance de proyecto emitido	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	5.0
16	EJECUCIÓN: Informe del 65% de avance de proyecto emitido	5-Entregables Intermedios	31/05/2015		31/05/2015		Sí	5.0
17	EJECUCIÓN: Informe del 70% de avance de proyecto emitido	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	5.0
18	EJECUCIÓN: Informe del 75% de avance de proyecto emitido	5-Entregables Intermedios	31/07/2015		31/07/2015		Sí	5.0
19	EJECUCIÓN: Informe del 80% de avance de proyecto emitido	5-Entregables Intermedios	31/08/2015		31/08/2015		Sí	5.0
20	EJECUCIÓN: Informe del 85% de avance de proyecto emitido	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2015		Sí	5.0
21	EJECUCIÓN: Informe del 90% de avance de proyecto emitido	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		31/10/2015		Sí	5.0
22	EJECUCIÓN: Informe del 95% de avance de proyecto emitido	5-Entregables Intermedios	30/11/2015		30/11/2015		Sí	5.0
23	EJECUCIÓN: Informe del 97% de avance de proyecto emitido	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2015		Sí	2.0
24	EJECUCIÓN: Informe del 98% de avance de proyecto emitido	5-Entregables Intermedios	31/01/2016		31/01/2016		Sí	1.0
25	CIERRE: Informe del 100% de avance de proyecto emitido y Liquidación	5-Entregables Intermedios	29/02/2016		29/02/2016		Sí	2.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	5,146,221.65 **
Costo Total:	6,053,231.05
Total Devengado:	5,140,054.03
% Costo Total Devengado:	84.91 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 84.91 %

Perfil Económico 2016

	Años Previos	Año Actual (2016)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	6,833,990.95	0.00	0.00	6,833,990.95
Ppto. Externo Planeado	780,759.90	0.00	0.00	780,759.90
Ppto. Aprobado Inicial	6,833,990.95	0.00	0.00	6,833,990.95
Ppto. Codificado	780,759.90	0.00	0.00	780,759.90
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2016)		0.00		
Programado a Devengar	5,120,561.95	29,655.85	0.00	5,150,217.80
Ppto. Devengado	5,116,565.80	23,488.23	0.00	5,140,054.03
Estimado a fin de año	* 5,116,565.80	29,655.85	0.00	5,146,221.65
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	3,996.15	0.00	0.00	3,996.15
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 99.92 %	79.20 %	0.00 %	99.80 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016

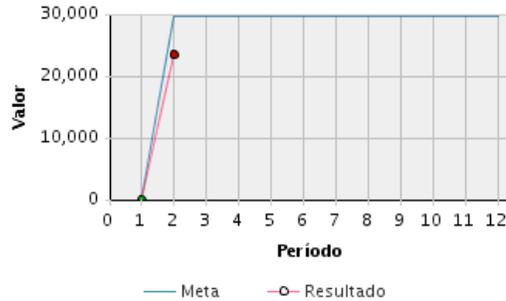

Presupuesto Mensual 2016

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2016							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	29,655.85	23,488.23	29,655.85	23,488.23	79.20 %		79.20 %
Mar							
Abr							
May							
Jun							
Jul							
Ago							
Sep							
Oct							
Nov							
Dic							
Total	29,655.85	23,488.23					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
4	Incrementar la capacidad instalada en redes de medio, bajo voltaje y alumbrado público MEDIANTE la ejecución de los planes anuales de expansión, la construcción, mejora y remodelación de redes de distribución y alumbrado público.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACIÓN HITO 01.-CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EEQ Y EEEP SG-502-2013	A.1..pdf	03/03/2016
2	ASOCIACIÓN HITO 02.-AVANCE PROCESOS ECUADOR ESTRATEGICO	A.2..pdf	03/03/2016
3	ASOCIACIÓN HITO 02.-PLIEGO PUBLICADO	A.3..pdf	03/03/2016
4	ASOCIACIÓN HITO 04.-CONTRATO DCP 273-2014 DEL CONVENIO SG-502-2013	A.4..pdf	03/03/2016
5	ASOCIACIÓN HITO 04.-CONTRATO DCP 274-2014 DEL CONVENIO SG-502-2013	A.5..pdf	03/03/2016
6	ASOCIACIÓN HITO 04.-CONTRATO DCP 275-2014 DEL CONVENIO SG-502-2013	A.6..pdf	03/03/2016
7	ASOCIACIÓN HITO 04.-CONTRATO DCP 276-2014 DEL CONVENIO SG-502-2013	A.7..pdf	03/03/2016
8	ASOCIACIÓN HITO 04.-CONTRATO DCP 277-2014 DEL CONVENIO SG-502-2013	A.8..pdf	03/03/2016
9	ASOCIACIÓN HITO 04.-CONTRATO DCP 379-2014 DEL CONVENIO SG-016-2014	A.9..pdf	03/03/2016
10	ASOCIACIÓN HITO 04.-CONTRATO DCP 451-2014 DEL CONVENIO SG-016-2014	B.1..pdf	03/03/2016
11	ASOCIACIÓN HITO 04.-CONTRATO SG 287-2014 DEL CONVENIO SG-016-2014	B.2..pdf	03/03/2016
12	ASOCIACIÓN HITO 04.-CONTRATO SG-226-2014 DEL CONVENIO SG-502-2013	B.3..pdf	03/03/2016
13	ASOCIACIÓN HITO 05.-SOLICITUD PAGO DE ANTICIPO CONTRATO DCP-273-2014	B.4..pdf	03/03/2016
14	ASOCIACIÓN HITO 05.-SOLICITUD PAGO DE ANTICIPO CONTRATO DCP-274-2014	B.5..pdf	03/03/2016
15	ASOCIACIÓN HITO 05.-SOLICITUD PAGO DE ANTICIPO CONTRATO DCP-275-2014	B.6..pdf	03/03/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
16	ASOCIACIÓN HITO 05.-SOLICITUD PAGO DE ANTICIPO CONTRATO DCP-276-2014	B.7..pdf	03/03/2016
17	ASOCIACIÓN HITO 05.-SOLICITUD PAGO DE ANTICIPO CONTRATO DCP-277-2014	B.8..pdf	03/03/2016
18	ASOCIACIÓN HITO 05.-SOLICITUD PAGO DE ANTICIPO CONTRATO DCP-379-2014	B.9..pdf	03/03/2016
19	ASOCIACIÓN HITO 05.-SOLICITUD PAGO DE ANTICIPO CONTRATO DCP-451-2014	C.1..pdf	03/03/2016
20	ASOCIACIÓN HITO 05.-SOLICITUD PAGO DE ANTICIPO CONTRATO SG-226-2014	C.2..pdf	03/03/2016
21	ASOCIACIÓN HITO 05.-SOLICITUD PAGO DE ANTICIPO CONTRATO SG-287-2014	C.3..pdf	03/03/2016
22	ASOCIACIÓN HITO 07.-LIQUIDACIÓN CONVENIO SG 093-2013	C.4..zip	03/03/2016
23	ASOCIACIÓN HITO 10.-REPORTE FINANCIERO PAGOS 2014	C.5..pdf	03/03/2016
24	ASOCIACIÓN HITO 12.-ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DCP-273-2014	C.6..pdf	03/03/2016
25	ASOCIACIÓN HITO 12.-ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DCP-274-2014	C.7..pdf	03/03/2016
26	ASOCIACIÓN HITO 12.-ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DCP-275-2014	C.8..pdf	03/03/2016
27	ASOCIACIÓN HITO 12.-ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DCP-276-2014	C.9..pdf	03/03/2016
28	ASOCIACIÓN HITO 12.-ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DCP-277-2014	D.1..pdf	03/03/2016
29	ASOCIACIÓN HITO 12.-ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL SG-226-2014	D.2..pdf	03/03/2016
30	ASOCIACIÓN HITO 12.-JUSTIFICATIVO OBTENIDO AL MES DE ENERO DE 2015	D.3..pdf	03/03/2016
31	ASOCIACIÓN HITO 13.-DEVOLUCIÓN SOLICITUD DE REFORMA AL PAC PARA CONTRATACIÓN DE CONSTRUCCIÓN PROYECTO COLONIA BABAHOYO 2 POR FALTA DE RECURSOS	D.4..pdf	03/03/2016
32	ASOCIACIÓN HITO 13.-JUSTIFICATIVO OBTENIDO AL MES DE FEBRERO DE 2015	D.5..pdf	03/03/2016
33	ASOCIACIÓN HITO 13.-SOLICITUD DE REFORMA AL PAC PARA CONTRATACIÓN DE CONSTRUCCIÓN PROYECTO COLONIA BABAHOYO 2	D.6..pdf	03/03/2016
34	ASOCIACIÓN HITO 14.-JUSTIFICATIVO OBTENIDO AL MES DE MARZO DE 2015	D.7..pdf	03/03/2016
35	ASOCIACIÓN HITO 14.-SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS	D.8..pdf	03/03/2016
36	ASOCIACIÓN HITO 14.-SOLICITUD TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA EEQ POR PARTE DE ECUADOR ESTRATÉGICO	D.9..pdf	03/03/2016
37	ASOCIACIÓN HITO 15.-JUSTIFICATIVO OBTENIDO AL MES DE ABRIL DE 2015	E.1..pdf	03/03/2016
38	ASOCIACIÓN HITO 16.-COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONTRATACIÓN DE CONSTRUCCIÓN PROYECTO COLONIA BABAHOYO 2	E.2..pdf	03/03/2016
39	ASOCIACIÓN HITO 16.-JUSTIFICATIVO OBTENIDO AL MES DE MAYO DE 2015	E.3..pdf	03/03/2016
40	ASOCIACIÓN HITO 16.-TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONTRATACIÓN DE CONSTRUCCIÓN PROYECTO COLONIA BABAHOYO 2	E.4..pdf	03/03/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
41	ASOCIACIÓN HITO 17.-JUSTIFICATIVO OBTENIDO AL MES DE JUNIO DE 2015	E.5..pdf	03/03/2016
42	ASOCIACIÓN HITO 17.-RESOLUCIÓN DE REFORMA AL PAC GEG-0296_2015 PARA CONTRATACIÓN DE CONSTRUCCIÓN PROYECTO COLONIA BABAHOYO 2	E.6..pdf	03/03/2016
43	ASOCIACIÓN HITO 18.-JUSTIFICATIVO OBTENIDO AL MES DE JULIO DE 2015	E.7..pdf	03/03/2016
44	ASOCIACIÓN HITO 18.-PLIEGO PUBLICADO COLONIA BABAHOYO 2 CÓDIGO MCBS-EEQSGD001-2015	E.8..pdf	03/03/2016
45	ASOCIACIÓN HITO 19.-JUSTIFICATIVO OBTENIDO AL MES DE AGOSTO DE 2015	E.9..pdf	03/03/2016
46	ASOCIACIÓN HITO 20.-CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 1 AL CONTRATO DCP-273-2014	F.1..pdf	03/03/2016
47	ASOCIACIÓN HITO 20.-CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 1 AL CONTRATO DCP-275-2014	F.2..pdf	03/03/2016
48	ASOCIACIÓN HITO 20.-CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 1 AL CONTRATO DCP-277-2014	F.3..pdf	03/03/2016
49	ASOCIACIÓN HITO 20.-CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 1 AL CONTRATO SG-226-2014	F.4..pdf	03/03/2016
50	ASOCIACIÓN HITO 20.-INFORME TÉCNICO CALIFICACIÓN DEL PROCESO MCBS-EEQSGD001-2015 (COLONIA BABAHOYO 2)	F.5..pdf	03/03/2016
51	ASOCIACIÓN HITO 20.-JUSTIFICATIVO OBTENIDO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	F.6..pdf	03/03/2016
52	ASOCIACIÓN HITO 20.-ORDEN DE TRABAJO Y ORDEN DE CAMBIO N° 1 AL CONTRATO DCP-274-2014	F.7..pdf	03/03/2016
53	ASOCIACIÓN HITO 20.-ORDEN DE TRABAJO Y ORDEN DE CAMBIO N° 1 AL CONTRATO DCP-276-2014	F.8..pdf	03/03/2016
54	ASOCIACIÓN HITO 20.-ORDEN DE TRABAJO Y ORDEN DE CAMBIO N° 1 AL CONTRATO DCP-451-2014	F.9..pdf	03/03/2016
55	ASOCIACIÓN HITO 21.-JUSTIFICATIVO OBTENIDO AL MES DE OCTUBRE DE 2015	G.1..pdf	03/03/2016
56	ASOCIACIÓN HITO 22.-CONTRATO DCP 242-2015 DEL CONVENIO SG-016-2013	G.2..pdf	03/03/2016
57	ASOCIACIÓN HITO 22.-JUSTIFICATIVO OBTENIDO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	G.3..pdf	03/03/2016
58	ASOCIACIÓN HITO 23.-JUSTIFICATIVO OBTENIDO AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	G.4..pdf	03/03/2016
59	ASOCIACIÓN HITO 23.-REPORTE FINANCIERO PAGOS 2015	G.5..pdf	03/03/2016
60	ASOCIACIÓN HITO 25.- Informe del 100% de avance de proyecto emitido y Liquidación	G.6._JUSTIFICATIVO_DEL_PROYECTO.pdf	03/03/2016
61	ASOCIACIÓN HITO 25.-Informe del 100% de avance de proyecto emitido y Liquidación	G.7._LIQUIDACION_ECONOMICA_242-2015.pdf	03/03/2016
62	ASOCIACIÓN HITO 25.-Informe del 100% de avance de proyecto emitido y Liquidación	G.8._Acta_entrega_Recepción_Definitiva_DCP-242-2015.pdf	03/03/2016
63	ASOCIACIÓN HITO 25.-Informe del 100% de avance de proyecto emitido y Liquidación	G9._Orden_de_Transferencia_502-758.pdf	01/04/2016

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Calderon Olivo, Juan Gabriel	Coordinador de Distribución	Analista	jgcalderon@eeq.com.ec	
Morales, Edwin	Director Técnico	Director Técnico	emorales@hotmail.com	
Yacche, Christian	Profesional 1	Ingeniero Eléctrico	cyacche@eeq.com.ec	

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
80014_1.jpg	18/12/2015
