

**EEQ - Empresa Eléctrica Quito**  
**Gerencia de Comercialización**  
**Dirección Clientes Especiales y Telemedición**

**PROYECTO: I008** MEER, Plan de Reducción de Pérdidas de Energía - PLANREP 2013-2017\_Empresa Eléctrica Quito

Líder del Proyecto:	Guerrero Melo, Mónica Patricia (moguerrero@eeq.com.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Gómez Miranda, Luis Fernando	Programas Relacionados:	
Titular:	Lalama Játiva, Lisette Pamela	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Activos Fijos	Retorno Económico:	2,362,432.11
CUP:	144210000.461.7142	TIR:	32.92 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	1,253,605.88
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	2,220,810.79
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2013 - 15/04/2018
Fecha de última actualización:	16/07/2018	Fecha de Fin Base:	31/03/2014
Modificado por:	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	Fecha del siguiente Hito:	15/04/2016

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

Convertido del Proyecto de Inversión K016 el 12/03/2015  
**DESCRIPCIÓN:** El Plan de Reducción de Pérdidas de Energía de la Empresa Eléctrica Quito considera ejecutar 3 proyectos, a continuación la denominación de cada uno:  
 Regularización de contravenciones en suministros de clientes de facturación masiva  
 Correctivos al sistema de medición en clientes de facturación especial  
 Cambio de medidores convencionales a electrónicos con registrador de demanda

**Objetivo del Plan:** El propósito del Plan de Reducción de Pérdidas de Energía 2013-2017, denominado PLANREP, reducir las pérdidas de energía en los sistemas de distribución a nivel nacional; así como priorizar la reducción de las pérdidas comerciales, sin descuidar el nivel de las pérdidas técnicas.

**PRODUCTO:**

Línea Base: Se establece como referencia el nivel de pérdidas de 6.78 % logrado hasta octubre de 2012.

**Estrategia del Plan:** Considerando que el PLANREP es un Programa que requiere la participación coordinada de las instituciones del sector eléctrico, se deberán conformar un Grupo de Trabajo Interinstitucional MEER, CONELEC, Distribuidoras, para colaborar en el seguimiento y ejecución de este programa.  
 La conformación de un área encargada del tratamiento de las pérdidas de energía en cada una de las distribuidoras permitirá cumplir con los objetivos básicos del PLANREP.  
 El grupo de trabajo para el PLANREP se encargará de la preparación de un programa por distribuidora en el que consten proyectos con características que las distribuidoras determinen cumplirán con la reducción de las pérdidas de energía; y realizará el seguimiento periódico de los indicadores y avances de ejecución de los proyectos tendientes a la reducción de pérdidas, que serán reportados a la Dirección de Supervisión y Control del CONELEC.  
 La ejecución estará a cargo de la Empresa Eléctrica Quito, con el financiamiento y coordinación del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable-MEER. El CONELEC realizará de forma periódica el seguimiento y control del avance económico y físico de los proyectos incluidos en este Plan.  
 Para el periodo 2013-2017 el PLANREP se ejecutará bajo los sistemas de contratación establecidos en el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), por parte de la empresa distribuidora o mediante la provisión de materiales y mano de obra contratada.

**Beneficios Cualitativos**

Reducir la afectación técnica y económica producida por las altas pérdidas de energía en las entidades de distribución de energía eléctrica y por consiguiente, mejorar los ingresos de las distribuidoras por venta de energía.  
 Reducción de pérdidas técnicas: disminución en compra o generación de energía y mejora de la confiabilidad del sistema, reduciendo fallas y por tanto perjuicios para los abonados.  
 Reducción de pérdidas comerciales: reducir el fraude y hurto de la energía mediante la regularización de usuarios, sustitución e instalación de medidores y la implementación de nuevos procesos de contratación de nuevo servicio, lecturas y facturación.

**Tipo de Beneficiario**

La población que se beneficia en este programa, es la del Ecuador, ya que la reducción de pérdidas de energía significa una optimización de los recursos, y que pueden ser destinados a otras actividades que permita mantener una buena gestión técnica y comercial de las empresas de distribución y que cumplan con los estándares nacionales e internacionales.

**Restricciones**

**TIEMPO:**

(Inicia: 01/01/2013 - Finaliza: 31/03/2018)

**COSTO:**

2 264 829.54 (Dos millón doscientos sesenta y cuatro mil ochocientos veinte y nueve con 54/100 dólares)

**CALIDAD**

Mejora de la imagen corporativa de la Empresa

Propicia la satisfacción del cliente debido al control de las novedades que afectan a los clientes honestos

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre


Completado

Congelado

**Cancelado**

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**




Transcurrido: 100.00 %

Fecha de Inicio: 01/01/2013

Fecha de Fin: 15/04/2018

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

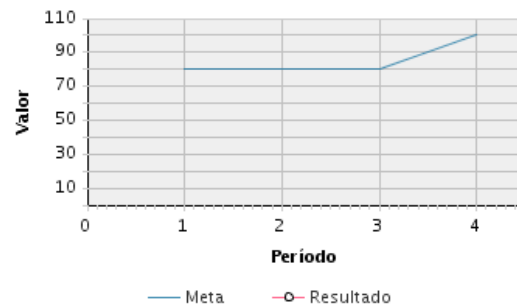

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	80 %	80 %	80 %	100 %								
	Avance real acumulado											
	Estado											

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
El Plan de control y reducción de pérdidas comerciales de energía eléctrica, propuesto para el periodo comprendido entre los años 2013 - 2017, ha sido sujeto de ejecución parcial durante los años 2013 y 2014, materializados a través de recursos provenientes de la fuente externa PGE y/o interna con recursos propios de la EEQ. Durante el año 2015 no se contó con recursos del Presupuesto General de Estado para proyectos de inversión con el propósito de controlar las pérdidas comerciales en el área de servicio de la EEQ. Sin embargo, con recursos internos la EEQ ha ejecutado labores para mantener y controlar los niveles de pérdidas comerciales logrados hasta la presente fecha, con revisiones selectivas de usuarios previamente analizados y con el reemplazo de medidores monofásicos con otros electrónicos de 220 V. Ante la incertidumbre de contar con recursos financieros provenientes del Presupuesto General del Estado para ejecutar planes de reducción de pérdidas a título de PLANREP, se establece que el proyecto "Plan de Reducción de Pérdidas de Energía - PLANREP 2013-2017_Empresa Eléctrica Quito" pasa a estado "cancelado".	Castellanos Perez, Edison Patricio	11/12/2015 - 03:15 PM
ENERO 2015 Proyecto congelado debida que hasta la fecha se desconoce si existirá asignación de recursos para la ejecución del PLANREP en el 2015.	Guerrero Melo, Mónica Patricia	06/03/2015 - 09:37 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>A DICIEMBRE</p> <p>El PLANREP 2014 consta de 3 proyectos:                      Regularización de hurtos y fraudes en suministros de clientes de facturación masiva 2014                      Correctivos al sistema de medición en clientes de facturación especial 2014                      Gestión de pérdidas con controladores de circuito 2014                      De estos proyectos uno se encuentra en proceso de liquidación (clientes de facturación especial).                      Los recursos asignados para el desarrollo de los proyectos del PLANREP 2014 alcanzan el valor de USD \$ 1.041.618,56. Los recursos devengados hasta la presente fecha por ejecución de contratos alcanzan el valor de USD 1.080.688,07. Que representa el 103.75% de lo asignado.</p> <p>EL PLANREP 2013 consta de 3 proyectos, 3 proyectos están en la etapa de liquidación.                      Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD \$ 1.223.210,98, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 1223.210,98, que representa el 100% de lo asignado. Dado por concluido los contratos del programa PLANREP 2013. En su totalidad.                      El indicador de "porcentaje de reducción de perdidas de energía" a la fecha alcanza un valor de: 5.65% .</p>	<p>Guerrero Melo, Mónica Patricia</p>	<p>14/01/2015 - 03:12 PM</p>
<p>A NOVIEMBRE 2014</p> <p>El PLANREP 2014 consta de 3 proyectos:                      Regularización de hurtos y fraudes en suministros de clientes de facturación masiva 2014                      Correctivos al sistema de medición en clientes de facturación especial 2014                      Gestión de pérdidas con controladores de circuito 2014                      De estos proyectos uno se encuentra en proceso de liquidación (clientes de facturación especial).                      Los recursos asignados para el desarrollo de los proyectos del PLANREP 2014 alcanzan el valor de USD \$ 1.041.618,56. Los recursos devengados hasta la presente fecha por ejecución de contratos alcanzan el valor de USD 994,795.20 que representa el 95.50% de lo asignado.</p> <p>EL PLANREP 2013 consta de 3 proyectos, 3 proyectos están en la etapa de liquidación.                      Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD \$ 1.223.210,98, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 1223.210,98, que representa el 100% de lo asignado. Dado por concluido los contratos del programa PLANREP 2013. En su totalidad.                      El indicador de "porcentaje de reducción de perdidas de energía" a la fecha alcanza un valor de: 5.62% .</p>	<p>Guerrero Melo, Mónica Patricia</p>	<p>30/12/2014 - 03:46 PM</p>
<p>A OCTUBRE 2014</p> <p>El PLANREP 2014 consta de 3 proyectos, mismos que se encuentran en etapa de ejecución.</p> <p>Correctivos al sistema de medición en clientes de facturación especial 2014                      Gestión de pérdidas con controladores de circuito 2014                      Regularización de hurtos y fraudes en suministros de clientes de facturación masiva 2014</p> <p>Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD \$ 1.041.618,56, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 855,140.44 que representa el 82.10% de lo asignado.</p> <p>EL PLANREP 2013 consta de 3 proyectos, 3 proyectos están en la etapa de liquidación.                      Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD \$ 1.223.210,98, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 1223.210,98, que representa el 100% de lo asignado. Dado por concluido los contratos del programa PLANREP 2013. En su totalidad.                      El indicador de "porcentaje de reducción de perdidas de energía" a la fecha alcanza un valor de: 5.78% .</p>	<p>Guerrero Melo, Mónica Patricia</p>	<p>02/12/2014 - 04:55 PM</p>
<p>A SEPTIEMBRE 2014</p> <p>El PLANREP 2014 consta de 3 proyectos, mismos que se encuentran en etapa de ejecución.</p> <p>Correctivos al sistema de medición en clientes de facturación especial 2014                      Gestión de pérdidas con controladores de circuito 2014                      Regularización de hurtos y fraudes en suministros de clientes de facturación masiva 2014</p>	<p>Guerrero Melo, Mónica Patricia</p>	<p>01/11/2014 - 04:37 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD \$ 1.041.618,56, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 846.618.91 que representa el 81,28% de lo asignado.</p> <p>El PLANREP 2013 consta de 3 proyectos, 3 proyectos están en la etapa de liquidación.</p> <p>Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD \$ 1.223.210,98, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 1 123.146,91, que representa el 91.82% de lo asignado.</p> <p>El Indicador de "Porcentaje de Reducción de Pérdidas de Energía" a la fecha alcanza un valor de: 5.71 %</p>		
<p><b>AGOSTO 2014</b></p> <p>El PLANREP 2014 consta de 3 proyectos, mismos que se encuentran en etapa de ejecución.</p> <p>Correctivos al sistema de medición en clientes de facturación especial 2014 Gestión de pérdidas con controladores de circuito 2014 Regularización de hurtos y fraudes en suministros de clientes de facturación masiva 2014</p> <p>Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD \$ 1.041.618,56, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 728 156,21, que representa el 87,87% de lo asignado.</p> <p>El PLANREP 2013 consta de 3 proyectos, 3 proyectos están en la etapa de liquidación.</p> <p>Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD \$ 1.223.210,98, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 1 123.146,91, que representa el 91.82% de lo asignado.</p> <p>El Indicador de "Porcentaje de Reducción de Pérdidas de Energía" a la fecha alcanza un valor de: 5.79 %</p>	<p>Guerrero Melo, Mónica Patricia</p>	<p>01/10/2014 - 08:02 AM</p>
<p><b>JULIO 2014</b></p> <p>El PLANREP 2014 consta de 3 proyectos, mismos que se encuentran en etapa de ejecución.</p> <p>Correctivos al sistema de medición en clientes de facturación especial 2014 Gestión de pérdidas con controladores de circuito 2014 Regularización de hurtos y fraudes en suministros de clientes de facturación masiva 2014</p> <p>Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD \$ 1.041.618,56, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 390 607,94, que representa el 37,50% de lo asignado.</p> <p>El PLANREP 2013 consta de 3 proyectos, 3 proyectos están en la etapa de liquidación.</p> <p>Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD \$ 1.223.210,98, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 1 123.146,91, que representa el 91.82% de lo asignado.</p> <p>El Indicador de "Porcentaje de Reducción de Pérdidas de Energía" a la fecha alcanza un valor de: 5.87 %.</p>	<p>Guerrero Melo, Mónica Patricia</p>	<p>01/09/2014 - 02:10 PM</p>
<p><b>JUNIO 2014</b></p> <p>El PLANREP 2014 consta de 3 proyectos, mismos que se encuentran en etapa de ejecución.</p> <p>Correctivos al sistema de medición en clientes de facturación especial 2014 Gestión de pérdidas con controladores de circuito 2014 Regularización de hurtos y fraudes en suministros de clientes de facturación masiva 2014</p>	<p>Guerrero Melo, Mónica Patricia</p>	<p>01/08/2014 - 06:49 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD \$ 1.041.618,56, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 348 964,29, que representa el 33,50% de lo asignado.</p> <p>Se reprograma acciones para cumplir con las metas establecidas e igualarse a la planificación</p> <p>El PLANREP 2013 consta de 3 proyectos, 3 proyectos están en la etapa de liquidación. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD \$ 1.223.210,98, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 1 123.146,91, que representa el 91.82% de lo asignado. El Indicador de "Porcentaje de Reducción de Pérdidas de Energía" a la fecha alcanza un valor de: 5.98 %.</p>		
<p>MAYO 2014</p> <p>El PLANREP 2014 consta de 3 proyectos, mismos que se encuentran en etapa de ejecución mediante contratos vigentes de 2013.</p> <p>Correctivos al sistema de medición en clientes de facturación especial 2014 Gestión de pérdidas con controladores de circuito 2014 Regularización de hurtos y fraudes en suministros de clientes de facturación masiva 2014</p> <p>Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD \$ 1.041.618,56, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 306 389, que representa el 29,41% de lo asignado.</p> <p>El PLANREP 2013 consta de 3 proyectos, 3 proyectos están en la etapa de liquidación.</p> <p>Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD \$ 1.223.210,98, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 1 123.146,91, que representa el 91.82% de lo asignado.</p> <p>El Indicador de "Porcentaje de Reducción de Pérdidas de Energía" a la fecha alcanza un valor de: 6.01 %.</p>	<p>Guerrero Melo, Mónica Patricia</p>	<p>03/07/2014 - 12:26 PM</p>
<p>ABRIL 2014</p> <p>El PLANREP 2014 consta de 3 proyectos, mismos que se encuentran en etapa de ejecución mediante contratos vigentes de 2013.</p> <p>Correctivos al sistema de medición en clientes de facturación especial 2014 Gestión de pérdidas con controladores de circuito 2014 Regularización de hurtos y fraudes en suministros de clientes de facturación masiva 2014</p> <p>Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD \$ 1.041.618,56, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 127 963.37, que representa el 12.29% de lo asignado.</p> <p>El PLANREP 2013 consta de 3 proyectos, 3 proyectos están en la etapa de liquidación.</p> <p>Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD \$ 1,223,210.98, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 1 123 146.91, que representa el 91.82% de lo asignado.</p> <p>El Indicador de "Porcentaje de Reducción de Pérdidas de Energía" a la fecha alcanza un valor de: 6.09 %.</p>	<p>Guerrero Melo, Mónica Patricia</p>	<p>30/05/2014 - 09:42 AM</p>
<p>MARZO 2014</p> <p>El PLANREP 2014 consta de 3 proyectos, que se encuentran en etapa de ejecución mediante contratos vigentes de 2013.</p> <p>Correctivos al sistema de medición en clientes de facturación especial 2014 Gestión de pérdidas con controladores de circuito 2014 Regularización de hurtos y fraudes en suministros de clientes de facturación masiva 2014</p> <p>Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 63,134.86, que representa el 6.06% de lo asignado.</p>	<p>Guerrero Melo, Mónica Patricia</p>	<p>30/04/2014 - 01:13 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>El PLANREP 2013 consta de 3 proyectos, 3 proyectos están en la etapa de cierre.</p> <p>Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD \$ 1,223,210.98, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 1,123,146.91, que representa el 91.82% de lo asignado.</p> <p>El Indicador de "Porcentaje de Reducción de Pérdidas de Energía" a la fecha alcanza un valor de: 6.37 %.</p>		
<p><b>FEBRERO</b></p> <p>El PLANREP 2014 consta de 3 proyectos, 3 proyectos están en la etapa de planeación.</p> <p>Correctivos al sistema de medición en clientes de facturación especial 2014 Gestión de pérdidas con controladores de circuito 2014 Regularización de contravenciones en suministros de clientes de facturación masiva 2014</p> <p>El PLANREP 2013 consta de 3 proyectos, 3 proyectos están en la etapa de cierre.</p> <p>Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD \$ 1,223,210.98, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 1,095,992.65, que representa el 89.60% de lo asignado.</p> <p>El Indicador de "Porcentaje de Reducción de Pérdidas de Energía" a la fecha alcanza un valor de: 6.06 %.</p>	Guerrero Melo, Mónica Patricia	01/04/2014 - 07:32 AM
<p><b>ENERO</b></p> <p>El PLANREP 2014 consta de 3 proyectos, 3 proyectos están en la etapa de planeación.</p> <p>Correctivos al sistema de medición en clientes de facturación especial 2014 Gestión de pérdidas con controladores de circuito 2014 Regularización de contravenciones en suministros de clientes de facturación masiva 2014</p> <p>El PLANREP 2013 consta de 3 proyectos, 3 proyectos están en la etapa de ejecución.</p> <p>Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD \$ 1,223,210.98, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 1,047,766.21, que representa el 85.66% de lo asignado.</p> <p>El Indicador de "Porcentaje de Reducción de Pérdidas de Energía" a la fecha alcanza un valor de: 6.43 %.</p>	Guerrero Melo, Mónica Patricia	05/03/2014 - 11:04 AM
<p><b>DICIEMBRE 2013</b></p> <p>El PLANREP 2013 consta de 3 proyectos, están en la etapa de ejecución.</p> <p>Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD 994,064.01, que representa el 77.18 % de lo asignado.</p> <p>El Indicador de "Porcentaje de Reducción de Pérdidas de Energía" a la fecha alcanza un valor de: 6.44%</p>	Guerrero Melo, Mónica Patricia	06/01/2014 - 09:18 AM
<p><b>NOVIEMBRE 2013</b></p> <p>El PLANREP 2013 consta de 3 proyectos, están en la etapa de ejecución.</p> <p>Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD 801,095.58, que representa el 65.49 % de lo asignado.</p> <p>El Indicador de "Porcentaje de Reducción de Pérdidas de Energía" a la fecha alcanza un valor de: 6.49%</p>	Guerrero Melo, Mónica Patricia	09/12/2013 - 11:21 AM
<p><b>OCTUBRE 2013</b></p> <p>El PLANREP 2013 consta de 3 proyectos, están en la etapa de ejecución.</p> <p>Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD 674,890.93, que representa el 55.17 % de lo asignado.</p> <p>El Indicador de "Porcentaje de Reducción de Pérdidas de Energía" a la fecha alcanza un valor de: 6.62%.</p>	Maldonado Palacios, Ing. Edgar Remigio	29/11/2013 - 04:22 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>SEPTIEMBRE 2013</p> <p>El PLANREP 2013 consta de 3 proyectos, están en la etapa de ejecución. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD 588,237.19, que representa el 48.09 % de lo asignado.</p> <p>El Indicador de "Porcentaje de Reducción de Pérdidas de Energía" a la fecha alcanza un valor de: 6.81%.</p>	Maldonado Palacios, Ing. Edgar Remigio	29/11/2013 - 04:21 PM
<p>AGOSTO 2013</p> <p>El PLANREP 2013 consta de 3 proyectos, 1 proyecto está en la etapa de planeación y 2 en ejecución. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD 549,917.22, que representa el 44.96 % de lo asignado.</p> <p>El Indicador de "Porcentaje de Reducción de Pérdidas de Energía" a la fecha alcanza un valor de: 6.66%.</p>	Maldonado Palacios, Ing. Edgar Remigio	29/11/2013 - 04:21 PM
<p>JULIO 2013</p> <p>El PLANREP 2013 consta de 3 proyectos, 1 proyectos están en la etapa de planeación y 2 en ejecución. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD 520,369.05, que representa el 42.54 % de lo asignado.</p> <p>El Indicador de "Porcentaje de Reducción de Pérdidas de Energía" a la fecha alcanza un valor de: 6.78%.</p>	Maldonado Palacios, Ing. Edgar Remigio	29/11/2013 - 04:20 PM
<p>ENERO - JUNIO 2013</p> <p>El PLANREP 2013 consta de 3 proyectos, 1 proyectos están en etapa de planeación y 2 en ejecución. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD 293,564.02, que representa el 24.00 % de lo asignado.</p> <p>El Indicador de "Porcentaje de Reducción de Pérdidas de Energía" a la fecha alcanza un valor de: 6.80</p>	Maldonado Palacios, Ing. Edgar Remigio	29/11/2013 - 04:19 PM
<p>ENERO</p> <p>El programa consta de 4 proyectos, están en la etapa de planeación. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanza el monto de USD \$ 17.481,88 que representa el 1,43 % de lo asignado. El indicador de "Porcentaje de pérdidas de energía" a la fecha alcanza el valor de 6,56%.</p>	Maldonado Palacios, Ing. Edgar Remigio	08/10/2013 - 12:52 PM

Problemas cerrados: 7, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 0

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto	
1	Zona 2 - Centro Norte > Napo > El Chaco
2	Zona 2 - Centro Norte > Napo > Quijos
3	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha

**HITOS**

Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1 PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_CAMBIO	1-Solicitud de Información	30/03/2013		25/06/2013		Sí	0.1

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	DE MEDIDORES DE CONVENCIONALES A ELECTRÓNICOS CON REGISTRADOR DE DEMANDA							
2	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_CORRECTIVOS AL SISTEMA DE MEDICIÓN EN CLIENTES DE FACTURACIÓN ESPECIAL	1-Solicitud de Información	30/03/2013		30/03/2013		Sí	0.3
3	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_REGULARIZACIÓN DE CONTRAVENCIONES EN SUMINISTROS DE CLIENTES DE FACTURACIÓN MASIVA	1-Solicitud de Información	30/03/2013		30/03/2013		Sí	2.41
4	PLANEACIÓN_Publicación del Proyecto en el SERCOP_CAMBIO DE MEDIDORES DE CONVENCIONALES A ELECTRÓNICOS CON REGISTRADOR DE DEMANDA	2-Publicación de Pliegos	30/04/2013		07/01/2013		Sí	0.06
5	PLANEACIÓN_Publicación del Proyecto en el SERCOP_CORRECTIVOS AL SISTEMA DE MEDICIÓN EN CLIENTES DE FACTURACIÓN ESPECIAL	2-Publicación de Pliegos	30/04/2013		14/01/2013		Sí	0.22
6	PLANEACIÓN_Publicación del Proyecto en el SERCOP_REGULARIZACIÓN DE CONTRAVENCIONES EN SUMINISTROS DE CLIENTES DE FACTURACIÓN MASIVA	2-Publicación de Pliegos	30/04/2013		03/06/2013		Sí	1.62
7	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_CAMBIO DE MEDIDORES DE CONVENCIONALES A ELECTRÓNICOS CON REGISTRADOR DE DEMANDA	3-Adjudicación	30/05/2013		09/02/2013		Sí	0.1
8	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_CORRECTIVOS AL SISTEMA DE MEDICIÓN EN CLIENTES DE FACTURACIÓN ESPECIAL	3-Adjudicación	30/05/2013		22/02/2013		Sí	0.33
9	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_REGULARIZACIÓN DE CONTRAVENCIONES EN SUMINISTROS DE CLIENTES DE FACTURACIÓN MASIVA	3-Adjudicación	30/05/2013		30/05/2013		Sí	2.43
10	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del PLANREP_Mayo 2013	5-Entregables Intermedios	15/06/2013		15/06/2013		Sí	0.1
11	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del PLANREP_Junio2013	5-Entregables Intermedios	15/07/2013		07/08/2013		Sí	0.1



HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
12	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_CAMBIO DE MEDIDORES DE CONVENCIONALES A ELECTRÓNICOS CON REGISTRADOR DE DEMANDA	4-Inicio de Trabajo	30/07/2013		01/05/2014		Sí	0.1
13	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_CORRECTIVOS AL SISTEMA DE MEDICIÓN EN CLIENTES DE FACTURACIÓN ESPECIAL	4-Inicio de Trabajo	30/07/2013		15/07/2013		Sí	0.33
14	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_REGULARIZACIÓN DE CONTRAVENCIONES EN SUMINISTROS DE CLIENTES DE FACTURACIÓN MASIVA	4-Inicio de Trabajo	30/07/2013		15/06/2013		Sí	2.43
15	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del PLANREP_Julio 2013	5-Entregables Intermedios	15/08/2013		08/02/2013		Sí	0.1
16	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del PLANREP_Agosto 2013	5-Entregables Intermedios	15/09/2013		05/09/2013		Sí	0.1
17	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_CAMBIO DE MEDIDORES DE CONVENCIONALES A ELECTRÓNICOS CON REGISTRADOR DE DEMANDA	4-Inicio de Trabajo	30/09/2013		31/12/2013		Sí	0.1
18	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_CORRECTIVOS AL SISTEMA DE MEDICIÓN EN CLIENTES DE FACTURACIÓN ESPECIAL	4-Inicio de Trabajo	30/09/2013		15/10/2013		Sí	0.33
19	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_REGULARIZACIÓN DE CONTRAVENCIONES EN SUMINISTROS DE CLIENTES DE FACTURACIÓN MASIVA	4-Inicio de Trabajo	30/09/2013		15/10/2013		Sí	2.43
20	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del PLANREP_Septiembre 2013	5-Entregables Intermedios	15/10/2013		02/10/2013		Sí	0.1
21	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del PLANREP_Octubre 2013	5-Entregables Intermedios	15/11/2013		11/11/2013		Sí	0.1
22	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del PLANREP_Noviembre 2013	5-Entregables Intermedios	15/12/2013		03/12/2013		Sí	0.1
23	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_CAMBIO DE MEDIDORES DE CONVENCIONALES A ELECTRÓNICOS CON REGISTRADOR DE DEMANDA	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2013		30/12/2013		Sí	0.13

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
24	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_CORRECTIVOS AL SISTEMA DE MEDICIÓN EN CLIENTES DE FACTURACIÓN ESPECIAL	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2013		30/12/2013		Sí	0.44
25	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_REGULARIZACIÓN DE CONTRAVENCIONES EN SUMINISTROS DE CLIENTES DE FACTURACIÓN MASIVA	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2013		30/12/2013		Sí	3.24
26	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del PLANREP_Diciembre 2013	5-Entregables Intermedios	15/01/2014		15/01/2014		Sí	0.1
27	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_CORRECTIVOS AL SISTEMA DE MEDICIÓN EN CLIENTES DE FACTURACIÓN ESPECIAL PLANREP 2014	1-Solicitud de Información	30/01/2014		30/01/2014		Sí	0.87
28	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_GESTION DE PERDIDAS CON CONTROLADORES DE CIRCUITO PLANREP 2014	1-Solicitud de Información	30/01/2014		30/01/2014		Sí	0.61
29	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_REGULARIZACIÓN DE CONTRAVENCIONES EN SUMINISTROS DE CLIENTES DE FACTURACIÓN MASIVA PLANREP2014	1-Solicitud de Información	30/01/2014		30/01/2014		Sí	1.37
30	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del PLANREP_Enero 2014	5-Entregables Intermedios	15/02/2014		15/02/2014		Sí	0.1
31	PLANEACIÓN_Publicación del Proyecto en el SERCOP_CORRECTIVOS AL SISTEMA DE MEDICIÓN EN CLIENTES DE FACTURACIÓN ESPECIAL PLANREP 2014	2-Publicación de Pliegos	28/02/2014		28/02/2014		Sí	0.58
32	PLANEACIÓN_Publicación del Proyecto en el SERCOP_GESTION DE PERDIDAS CON CONTROLADORES DE CIRCUITO PLANREP 2014	2-Publicación de Pliegos	28/02/2014		28/02/2014		Sí	0.41
33	PLANEACIÓN_Publicación del Proyecto en el SERCOP_REGULARIZACIÓN DE CONTRAVENCIONES EN SUMINISTROS DE CLIENTES DE FACTURACIÓN MASIVA PLANREP 2014	2-Publicación de Pliegos	28/02/2014		28/02/2014		Sí	0.91
34	CIERRE_Liquidación de Obras_CAMBIO DE MEDIDORES DE CONVENCIONALES A ELECTRÓNICOS CON REGISTRADOR DE DEMANDA	9-Entregables Formales	01/03/2014		01/03/2014		Sí	0.06
35	CIERRE_Liquidación de Obras_CORRECTIVOS AL	9-Entregables Formales	01/03/2014		01/03/2014		Sí	0.22






HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	SISTEMA DE MEDICIÓN EN CLIENTES DE FACTURACIÓN ESPECIAL							
36	CIERRE_Liquidación de Obras_REGULARIZACIÓN DE CONTRAVENCIONES EN SUMINISTROS DE CLIENTES DE FACTURACIÓN MASIVA	9-Entregables Formales	01/03/2014		01/03/2014		Sí	1.62
37	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del PLANREP_Febrero 2014	5-Entregables Intermedios	15/03/2014		15/03/2014		Sí	0.1
38	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_CORRECTIVOS AL SISTEMA DE MEDICIÓN EN CLIENTES DE FACTURACIÓN ESPECIAL PLANREP 2014	3-Adjudicación	30/03/2014		30/03/2014		Sí	0.87
39	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_GESTION DE PERDIDAS CON CONTROLADORES DE CIRCUITO PLANREP 2014	3-Adjudicación	30/03/2014		30/03/2014		Sí	0.61
40	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_REGULARIZACIÓN DE CONTRAVENCIONES EN SUMINISTROS DE CLIENTES DE FACTURACIÓN MASIVA PLANREP 2014	3-Adjudicación	30/03/2014		30/03/2014		Sí	1.22
41	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del PLANREP_Marzo 2014	5-Entregables Intermedios	15/04/2014		15/04/2014		Sí	0.1
42	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_CORRECTIVOS AL SISTEMA DE MEDICIÓN EN CLIENTES DE FACTURACIÓN ESPECIAL PLANREP 2014	4-Inicio de Trabajo	18/04/2014		18/04/2014		Sí	0.87
43	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_GESTION DE PERDIDAS CON CONTROLADORES DE CIRCUITO PLANREP 2014	4-Inicio de Trabajo	18/04/2014		18/04/2014		Sí	0.61
44	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_REGULARIZACIÓN DE CONTRAVENCIONES EN SUMINISTROS DE CLIENTES DE FACTURACIÓN MASIVA PLANREP 2014	4-Inicio de Trabajo	18/04/2014		18/04/2014		Sí	1.37
45	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del PLANREP_Abril 2014	5-Entregables Intermedios	15/05/2014		15/05/2014		Sí	0.1
46	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_CORRECTIVOS AL SISTEMA DE MEDICIÓN EN CLIENTES DE FACTURACIÓN ESPECIAL PLANREP 2014	4-Inicio de Trabajo	18/05/2014		18/05/2014		Sí	0.87
47	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_GESTION DE PERDIDAS CON	4-Inicio de Trabajo	18/05/2014		18/05/2014		Sí	0.61

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	CONTROLADORES DE CIRCUITO PLANREP 2014							
48	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_REGULARIZACIÓN DE CONTRAVENCIONES EN SUMINISTROS DE CLIENTES DE FACTURACIÓN MASIVA PLANREP 2014	4-Inicio de Trabajo	18/05/2014		18/05/2014		Sí	1.22
49	EJECUCIÓN_ Informe Mensual de Avance del PLANREP_Mayo 2014	5-Entregables Intermedios	15/06/2014		15/06/2014		Sí	0.1
50	EJECUCIÓN_ Informe Mensual de Avance del PLANREP_Junio2014	5-Entregables Intermedios	15/07/2014		15/07/2014		Sí	0.1
51	EJECUCIÓN_ Informe Mensual de Avance del PLANREP_Julio 2014	5-Entregables Intermedios	15/08/2014		15/08/2014		Sí	0.1
52	EJECUCIÓN_ Informe Mensual de Avance del PLANREP_Agosto 2014	5-Entregables Intermedios	15/09/2014		15/09/2014		Sí	0.1
53	EJECUCIÓN_ Informe Mensual de Avance del PLANREP_Septiembre 2014	5-Entregables Intermedios	15/10/2014		15/10/2014		Sí	0.1
54	EJECUCIÓN_ Informe Mensual de Avance del PLANREP_Octubre 2014	5-Entregables Intermedios	15/11/2014		15/11/2014		Sí	0.1
55	EJECUCIÓN_ Informe Mensual de Avance del PLANREP_Noviembre 2014	5-Entregables Intermedios	15/12/2014		15/12/2014		Sí	0.1
56	EJECUCIÓN_ Informe Mensual de Avance del PLANREP_Diciembre2014	5-Entregables Intermedios	15/01/2015		15/01/2015		Sí	0.1
57	EJECUCIÓN_ Informe Mensual de Avance del PLANREP_Enero2015	5-Entregables Intermedios	15/02/2015		15/02/2015		Sí	0.1
58	EJECUCIÓN_ Informe Mensual de Avance del PLANREP_Febrero 2015	5-Entregables Intermedios	15/03/2015		15/03/2015		Sí	0.1
59	EJECUCIÓN_ Informe Mensual de Avance del PLANREP_Marzo 2015	5-Entregables Intermedios	18/04/2015		18/04/2015		Sí	0.1
60	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_CORRECTIVOS AL SISTEMA DE MEDICIÓN EN CLIENTES DE FACTURACIÓN ESPECIAL PLANREP 2014	9-Entregables Formales	20/07/2015		20/07/2015		Sí	1.16
61	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_GESTION DE PERDIDAS CON CONTROLADORES DE CIRCUITO PLANREP 2014	9-Entregables Formales	20/07/2015		20/07/2015		Sí	0.82
62	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_REGULARIZACIÓN DE CONTRAVENCIONES EN SUMINISTROS DE CLIENTES DE FACTURACIÓN MASIVA PLANREP 2014	9-Entregables Formales	20/07/2015		20/07/2015		Sí	1.82
63	CIERRE_Liquidación de Obras_CORRECTIVOS AL SISTEMA DE MEDICIÓN EN	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	03/08/2015		03/08/2015		Sí	0.58

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	CLIENTES DE FACTURACIÓN ESPECIAL PLANREP 2014							
64	CIERRE_Liquidación de Obras_GESTION DE PERDIDAS CON CONTROLADORES DE CIRCUITO PLANREP 2014	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	03/08/2015		03/08/2015		Sí	0.41
65	CIERRE_Liquidación de Obras_REGULARIZACIÓN DE CONTRAVENCIONES EN SUMINISTROS DE CLIENTES DE FACTURACIÓN MASIVA PLANREP 2014	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	03/08/2015		03/08/2015		Sí	0.91
66	PLANREP 2015	1-Solicitud de Información	15/04/2016	15/04/2016			No	20.0
67	PLANREP 2016	1-Solicitud de Información	15/04/2017	15/04/2017			No	20.0
68	PLANREP 2017	1-Solicitud de Información	15/04/2018	15/04/2018			No	20.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	1,058,946.49
Estimado Al Fin Del Proyecto:	2,220,810.79 **
Costo Total:	2,220,810.79
Total Devengado:	2,220,810.79
% Costo Total Devengado:	100.00 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**



% Costo Total Devengado: 100.00 %

**Perfil Económico 2018**

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	1,953,648.50	0.00	0.00	1,953,648.50
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ppto. Aprobado Inicial</b>	1,953,648.50	0.00	0.00	1,953,648.50
Ppto. Codificado	1,223,210.98	0.00	0.00	1,223,210.98
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2018)		0.00		
<b>Programado a Devengar</b>	2,175,771.32	0.00	0.00	2,175,771.32
Ppto. Devengado	2,220,810.79	0.00	0.00	2,220,810.79
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 2,220,810.79	0.00	0.00	2,220,810.79
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-45,039.47	0.00	0.00	-45,039.47
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 102.07 %	0.00 %	0.00 %	102.07 %
<b>Ppto. Codificado 998</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ppto. Devengado 998</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018**



**Presupuesto Mensual 2018**

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May							
Jun							
Jul							
Ago							
Sep							
Oct							
Nov							
Dic							
<b>Total</b>	<b>0.00</b>						

**OBJETIVOS ALINEADOS**

Objetivos Operativos	
7	Mantener los niveles de pérdidas comerciales MEDIANTE programas de supervisión de suministros de clientes de facturación masiva y especial

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Acta de Cumplimiento	Informe_Mensual_de_Avance_del_PLANREP_Junio2013.pdf	05/12/2013
2	Acta de Cumplimiento	Informe_Mensual_de_Avance_del_PLANREP_Julio_2013.pdf	05/12/2013
3	Acta de Cumplimiento	Informe_Mensual_de_Avance_del_PLANREP_Agosto_2013.pdf	05/12/2013
4	Acta de Cumplimiento	Informe_Mensual_de_Avance_del_PLANREP_Septiembre_2013.pdf	05/12/2013
5	Acta de Cumplimiento	Informe_Mensual_de_Avance_del_PLANREP_Octubre_2013.pdf	05/12/2013
6	Acta de Cumplimiento	Informe_Mensual_de_Avance_del_PLANREP_Mayo_2013.pdf	09/12/2013
7	Acta de Cumplimiento	Informe_Mensual_de_Avance_del_PLANREP_Noviembre_2013.pdf	12/2013
8	Acta de Cumplimiento	Informe_Mensual_de_Avance_del_PLANREP_Diciembre_2013.pdf	12/2014
9	Acta de Cumplimiento	CAMBIO_DE_MEDIDORES_DE_CONVENCIONALES_A_ELÉCTRONICOS_CON_REGISTR	20/02/2014
10	Acta de Cumplimiento	CORRECCIONES_AL_SISTEMA_EN_CLIENTES_DE_FACTURACIÓN ESPECIAL.pdf	29/02/2014
11	Acta de Cumplimiento	REGULARIZACIÓN_DE_CONTRAVENCIONES_EN_SUMINISTROS_DE_CLIENTES_DE_F	27/02/2014
12	Acta de Cumplimiento	Informe_Mensual_de_Avance_del_PLANREP_Enero_2014.pdf	10/02/2014
13	Acta de Cumplimiento	Informe_Mensual_de_avance_del_PLANREP_febrero_2014.pdf	18/03/2014
14	Acta de Cumplimiento	Informe_Mensual_de_avance_del_PLANREP_marzo_2014.pdf	29/04/2014
15	Acta de Cumplimiento	Informe_Mensual_de_Avance_del_PLANREP_ABRIL_2014.pdf	09/05/2014
16	Acta de Cumplimiento	Informe_Mensual_de_Avance_del_PLANREP_Julio2014.pdf	31/07/2014
17	Acta de Cumplimiento	Informe_Mensual_de_Avance_del_PLANREP_Junio2014.pdf	02/08/2014
18	Acta de Cumplimiento	INFORME_MENSUAL_DE_AVANCE_DEL_PLANREP_JULIO2014.pdf	02/08/2014
19	Acta de Cumplimiento	INFORME_MENSUAL_DE_AVANCE_DEL_PLANREP_AGO2014.pdf	20/02/2014
20	Acta de Cumplimiento	Informe_Mensual_De_Avance_Del_PLANREP_AGOSTO2014.pdf	10/02/2014
21	Acta de cumplimiento	INFORME_MENSUAL_DEL_AVANCE_PLANREP_OCTUBRE2014.pdf	22/02/2014
22	Acta de cumplimiento	INFORME_MENSUAL_DE_AVANCE_DEL_PLANREP_SEPTIEMBRE2014.pdf	22/02/2014
23	Acta de Cumplimiento	INFORME_MENSUAL_DE_AVANCE_DEL_PLANREP_ENERO2015.pdf	20/02/2015
24	Acta de Cumplimiento	INFORME_MENSUAL_DE_AVANCE_DEL_PLANREP_FEBRERO2015.pdf	20/02/2015
25	Acta de Cumplimiento	INFORME_MENSUAL_DE_AVANCE_DEL_PLANREP_MARZO2015.pdf	20/02/2015
26	Acta de cumplimiento	INFORME_MENSUAL_DE_AVANCE_DEL_PLANREP_NOVIEMBRE2014.pdf	18/02/2014
27	Acta de Cumplimiento	INFORME_MENSUAL_DE_AVANCE_PLANREP_DICIEMBRE2014.pdf	18/02/2014

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
28	Acta de Liquidación Final	ACTAS_DE_LIQUIDACIÓN_FINAL_CLIENTES_ESPECIAL	30/10/2015
29	Acta de Liquidación Final	ACTA_RECEPCIÓN_DEFINITIVA_CONTRATO_TOTALIZADO	20/08/2015
30	Acta de Liquidación Final	ACTA_RECEPCIÓN_DEFINITIVA_CONTRATO_Reg_Cont.	30/10/2015
31	Informe mensual al CONELEC.	INFORME_MENSUAL.pdf	13/01/2015
32	Perfil del Plan	Perfil_SENPLADES_PLANREP_2013-2017.pdf	09/12/2013
33	Priorización SENPLADES	SENPLADES-SIP-dap-2010-1041_PLANREP.pdf	09/12/2013
34	Z1_JUSTIFICACIÓN DE CANCELACIÓN DE PROYECTO	INFORME_DE_CANCELACIÓN_DE_PROYECTO.pdf	16/12/2015
35	Z2_ACTA DE ACLARACIÓN	ACLARACIONES_CON_RESPECTO_A_LADESVIACIÓN_EN	05/02/2016

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Maldonado Palacios, Ing. Edgar Remigio	Líder Técnico	Jefe Departamento Pérdidas Comerciales - EEQ	rmaldonado@eeq.com.ec	
Moreno Mejía, Jorge Anibal	Coordinador	Jefe Sección Ingeniería - Departamento Control de Pérdidas Comerciales	jmoreno@eeq.com.ec	
Rivadeneira , Hernán Camilo	Coordinador	Jefe Sección Operativa - Departamento Control de Pérdidas Comerciales	hrivadeneira@eeq.com.ec	
Soria Riera, Ana María	Coordinador	Ingeniero Eléctrico -EEQ	amsoria@eeq.com.ec	
